

水池水塔清洗設備檢查及水質檢驗紀錄表


通報編號： (填寫說明： 表示 年 月所通報編號 之清洗案)
 廠商名稱： 檢查日期： 114 年 1 月 12 日

基本資料	11 北市 區 廣州路 段 巷 弄 6 號						連絡人	吳志軒	
	場所名稱		南門國小		e-mail	大池		電話	23115052
	水池 1 座，總計 30 噸；水塔 1 座，總計 25 噸								
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 編號： (編號以英文字母表示如：A.B.C……Z) ☒ 一樓地面 ☐ 地下 層 ☐ 其他							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L 3 W 5 H 2 (m) 30 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 4 積水 ☐ 6 設於地面(板)下 ☐ 其他 ☐ 5 污水管由內部或上方通過 ☐ 6 與外牆未隔離 ☐ 6 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水池併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☐ 正常 ☐ 池內有異物 ☒ 底部不潔 ☐ 10 沉水幫浦銹蝕 ☐ 10 鋼筋裸露生銹 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： 41 編號： (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3……10)							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L 2 W 5 H 2.5 (m) 25 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 10 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他							
	結構體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水塔或管線併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 8 未密閉 ☒ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
通氣管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管								
內部狀況	☐ 正常 ☐ 池內有異物 ☒ 底部不潔 ☐ 10 鋼筋裸露生銹 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕								
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估 ☐ 水質合格 ☐ 水質不合格 (*請參照說明)
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	
清洗前	水池	114.1.12	09:40	0.29	6.9	71	0.11	—	
	水塔	"	10:25	0.18	6.8	72	0.09	—	
清洗後	水池	"	11:35	0.20	7.1	60	0.26	—	
	水塔	"	12:20	0.31	7.9	60	0.24	—	
說明		水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。							
建議改善事項		收件之章 臺北中正區南門國民小學 檢驗章 8733-1029 合格							

備註：每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 頁；共 頁)。

水池及水塔現場清洗照片（請依序貼照片）

()水池清洗前

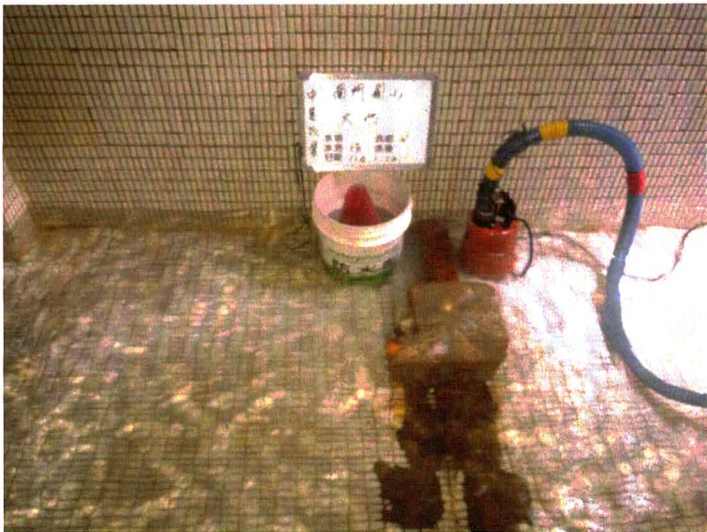

()水池清洗後



()水塔清洗前



()水塔清洗後



水池水塔清洗設備檢查及水質檢驗紀錄表

通報編號：

(填寫說明：

表示 年 月

所通報編號

之清洗案)

廠商名稱：

檢查日期：114 年 1 月 12 日

基本資料	台 北市 區 廣州街 路 段 巷 弄 6 號						連絡人 吳老師		
	場所名稱 南門國小		e-mail		電話 29371505				
水池 1 座，總計 11.5 噸；水塔 1 座，總計 1.5 噸									
水池設備檢查	位置樓層		棟別或地點： 編號： (編號以英文字母表示如：A.B.C.....Z)						
			☒ 一樓地面 ☐ 地下 層 ☐ 其他						
	結構材質		☐ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP						
	容量		容量:L 1.5 W 3 H 2.5 (m) 11.5 噸						
	周圍狀況		☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 4 積水 ☐ 6 設於地面(板)下 ☐ 其他						
			☐ 5 污水管由內部或上方通過 ☐ 6 與外牆未隔離 ☐ 6 與污水池或化糞池相鄰						
	結構體		☒ 正常 ☐ 2 與消防水池併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備						
	頂部狀況		☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他						
	人孔狀況		☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽						
	溢排管		☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管						
通氣管		☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
內部狀況		☐ 正常 ☐ 池內有異物 ☒ 底部不潔 ☐ 10 沉水幫浦銹蝕 ☐ 10 鋼筋裸露生鏽 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層		棟別或地點： 471 編號： (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)						
	結構材質		☐ 不銹鋼 ☒ 鋼筋混凝土 ☐ FRP						
	容量		容量:L 2.5 W 4 H 1.2 (m) 1.5 噸						
	周圍狀況		☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 10 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他						
	結構體		☒ 正常 ☐ 2 與消防水塔或管線併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備						
	頂部狀況		☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他						
	人孔狀況		☐ 正常 ☐ 8 未密閉 ☒ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽						
	溢排管		☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管						
	通氣管		☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管						
內部狀況		☐ 正常 ☐ 池內有異物 ☒ 底部不潔 ☐ 10 鋼筋裸露生鏽 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕							
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH 值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	
清洗前	水池	114.1.12	09:45	0.38	6.9	71	0.09	—	☒ 水質合格 ☐ 水質不合格 (*請參照說明)
	水塔	"	10:30	0.38	6.6	72	0.11	—	
清洗後	水池	"	11:40	0.31	7.9	60	0.36	—	
	水塔	"	12:25	0.30	7.9	60	0.34	—	
說明		水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「—」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科 87335962。							
建議改善事項		 							


備註：每個水池及水塔都需檢查並作成紀錄。(第 頁；共 頁)。

水池及水塔現場清洗照片（請依序貼照片）

()水池清洗前



()水池清洗後

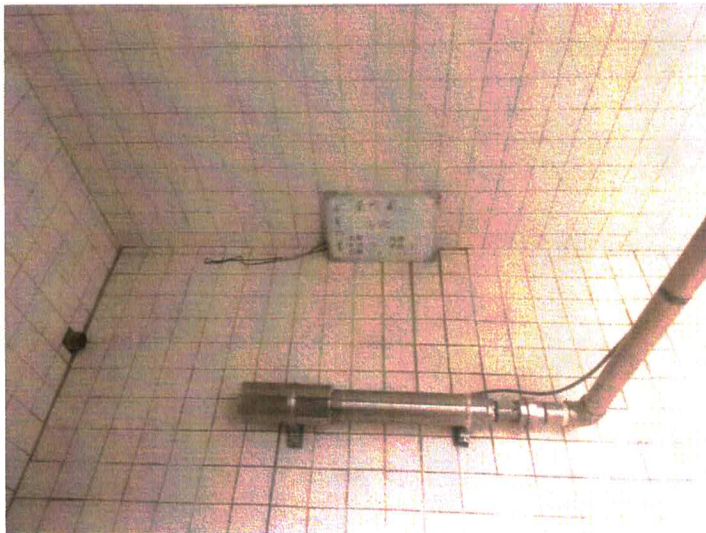

()水塔清洗前



()水塔清洗後

